

***LATVIJAS REPUBLIKAS  
VESELĪBAS MINISTRIJA***

# VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA ADMINISTRĒTĀJU



**Nosaukums:** LR Veselības ministrija

**Adrese:** Brīvības iela 72, Rīga, LV – 1011, Latvija

**Darbības veids:** Valsts pārvaldes iestāde

**Kontaktpersona:** *Ilona Herca*

*Tālrunis: 67876112*

*E-pasta adrese: [ilona.herca@vm.gov.lv](mailto:ilona.herca@vm.gov.lv)*

**Atbildīgā persona:** *Kristīne Grāvīte*

*Tālrunis: 67876118*

*E-pasta adrese: [kristine.gravite@vm.gov.lv](mailto:kristine.gravite@vm.gov.lv)*

# PROJEKTA IEVIEŠANA



## Aktivitāšu ieviešanas progress

Aktivitāte	Ieviešanas sākums un beigas	Aktivitāte mērķis un plānotais rezultāts	Sasniegtais rezultāts uz 2011.gada 1.septembri
Projekta administrēšana	2008. gada oktobris 2013.gada septembris	Veikt projekta plānošanu, administrēšanu, īstenošanas nodrošināšanu un uzraudzību  Izveidot projekta administrēšanas vienību	Projektu administrē Veselības ministrija kā finansējuma saņēmējs, projekta administrēšanā ir iesaistītas 6 personas
Projekta īstenošana	2009. gada marts 2013.gada septembris	Sniegt priekšlikumus projekta aktivitāšu ieviešanai, izvērtēt tālākizglītības pasākumu rezultātus, atspoguļot nozares aktualitātes projekta ietvaros īstenotajos tālākizglītības pasākumos  Izveidota projekta plānošanas un uzraudzības komisija Izveidota datu bāze	Projekta plānošanas un uzraudzības komisijā līdz 2011. gada septembrim darbojas 9 eksperti. Turpmāk, līdz 2013.gada maijam, darbu komisijā turpinās 5 eksperti.  Izveidota datu bāze statistisko datu iegūšanai un apkopošanai

# PROJEKTA IEVIEŠANA



Aktivitāte	Ieviešanas sākums un beigas	Aktivitāte mērķis un plānotais rezultāts	Sasniegtais rezultāts uz 2011.gada 1.septembri
Cilvēkresursu apmācības plāna izstrāde	2009. gada marts 2011.gada jūnijs	Nodrošināt cilvēkresursu apmācību atbilstoši nozares prioritātēm, ievērojot mērķauditorijas vajadzības  Izstrādāts cilvēkresursu apmācības plāns	Izstrādāts un aktualizēts cilvēkresursu apmācības plāns. 2011.gada jūnijā tika pabeigta plāna II aktualizācija, kas ir pamats turpmāko apmācību plānošanā projekta ietvaros
Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide	2008.gada novembris 2013.gada septembris	Pilnveidot personāla zināšanas un prasmes profesionālās saskarsmes, veselības nozares vadības, pacientu tiesību, kā arī jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās  Plānots realizēt 13 mācību programmas un apmācīt 10 500 personas	<u>Realizētas 7 apmācību programmas</u>  <u>Apmācītas 8906 personas</u>

# PROJEKTA IEVIEŠANA



Aktivitāte	Ieviešanas sākums un beigas	Aktivitāte mērķis un plānotais rezultāts	Sasniegtais rezultāts uz 2011.gada 1.septembri
Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide	2008. gada novembris 2013.gada septembris  Plānots realizēt 60 mācību programmas atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu apmācības plānam dažādās veselības aprūpes nozares jomās, piemēram, sabiedrības veselība, primārā veselības aprūpe, neatliekamās medicīniskā palīdzība	Nodrošināt personāla tālākizglītību iegūtajā specialitātē profesionālās kvalifikācijas uzturēšanai un pilnveidei atbilstoši resertifikācijas prasībām Plānots realizēt 60 mācību programmas Plānots apmācīt 15 340 personas  <u>Izstrādāt 10 izglītības standartus un vadlīnijas</u>	<u>Realizētas 50 apmācības programmas</u>  <u>Apmācītas 14 907 personas</u>  <u>Izstrādātas 2 izglītības vadlīnijas un 8 izglītības standarti</u>

# PROJEKTA IEVIEŠANA



Aktivitāte	Ieviešanas sākums un beigas	Aktivitāte mērķis un plānotais rezultāts	Sasniegtais rezultāts uz 2011.gada 1.septembri
Cilvēkresursu pārkvalifikācija	2008. gada novembris 2011.gada septembris	Nodrošināt cilvēkresursu piesaisti un mobilitāti veselības nozares darba tirgus vajadzībām Plānots realizēt 6 apmācības programmas un apmācīt 900 personas	<u>Realizētas 6 apmācības programmas</u> <u>Apmācītas 415 personas</u>
Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana	2008. gada novembris 2013.gada septembris	Nodrošināt profesionālo zināšanu un prasmju iegūvi māsu pamatspecialitātēs un papildspecialitātēs. Plānots realizēt 12 apmācības programmas  Plānots apmācīt 5400 māsas	<u>Tiek realizētas 7 mācību programmas māsas pamatspecialitātes ieguvei un 5 mācību programmas māsas papildspecialitātes ieguvei</u>  <u>Apmācītas 716 personas</u>

# PROJEKTA IEVIEŠANA



Aktivitāte	Ieviešanas sākums un beigas	Aktivitāte mērķis un plānotais rezultāts	Sasniegtais rezultāts uz 2011.gada 1.septembri
Personu profesionālās darbības atjaunošana	2008. gada novembris 2012.gada decembris	Nodrošinātu māsu, ārsta palīgu, vecmāšu, māsas palīgu, kā arī citu speciālistu, kuri nav praktizējuši profesijā ilgāku laiku, adaptāciju un iekļaušanos darba tirgū  Plānots realizēt 5 apmācības programmas un apmācīt 1860 personas	<u>Realizētas 4 apmācības programmas</u>  <u>Apmācītas 966 personas</u>
Personāla pieredzes apmaiņa	2009.gada jūnijs 2013.gada jūnijs Sniegt informāciju un nodrošināt publicitātes pasākumus par projektu, projektā īstenotajām aktivitātēm	Nodrošināt jaunu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanu un pilnveidot esošo pakalpojumu kvalitāti, organizējot pieredzes iegūšanas pasākumus ārvalstīs vai Latvijā, piesaistot ārvalstu speciālistus  Plānots atbalstīt 500 personas	Saņemti 52 pretendentu pieteikumi. <u>Atbalstītas 24 fiziskas personas un 5 juridiskas personas</u>
Informācijas un publicitātes pasākumi	2008. gada novembris 2013.gada septembris	Izveidota interneta mājas lapa un nodrošināta informācijas par projektu pieejamība	Sniegt informāciju un nodrošināt publicitātes pasākumus

# PROJEKTA IEVIEŠANA



## REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI (uz 01.09.2011)

Rādītājs	Mērvienība	Sākotnējā vērtība	Plānotā vērtība	Sasniegtā vērtība	Progress [%]
Projekta ietvaros atbalstīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu skaits	personas	0	34 500	25 933	75.16
Projekta ietvaros atbalstīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu īpatsvars, kas saņem apmācību apliecinājošos dokumentus	%	0	80	75.16	93.96




# PROJEKTA IEVIEŠANA




## Finansējuma apguves progress

Aktivitāte	Plānotais kopā (LVL)	Apgūts kopā uz 01.09.2011 (LVL)	Apgūts kopā uz 01.09.2011 (%)
1.1. Projekta administrēšana	415 840	194 338.00	46.73%
2.1. Projekta īstenošana	2 48 109.92	196 450.00	79.18%
2.2. Cilvēkresursu apmācības plāna izstrāde	95 935.00	95 934.00	100%
2.3.1. Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide	1 730 686.00	1 228 950.00	71.01%
2.3.2. Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide	2 434 970.83	1 182 081.00	48.55%
2.3.3. Cilvēkresursu pārkvalifikācija	747 425	650 743.00	87.06%
2.3.4. Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana	2 745 360.00	1 974 121.00	71.91%
2.3.5. Personu profesionālās darbības atjaunošana	760 626.00	440 700.00	57.94%
2.3.6. Personāla pieredzes apmaiņa	349 349.00	10 204.00	2.92%
2.4. Informācijas un publicitātes pasākumi	252 200.00	213 475.00	84.65%
3. Neparedzētie izdevumi	420 350.00	0.00	0.00
<b>KOPĀ</b>	<b>10 200 851.75</b>	<b>6 186 996.00</b>	<b>60.65%</b>


### Apmācīto personu skaits aktivitātēs (kopējais skaits – 25933) uz 01.09.2011

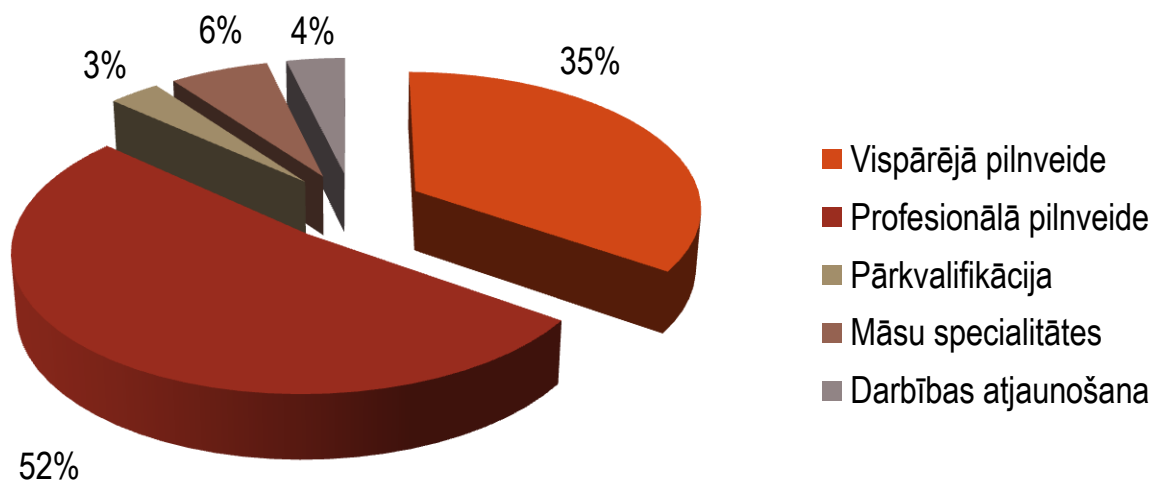

**Apmācīto personu skaits reģionos  
(kopējais skaits – 25 933) uz 01.09.2011.**

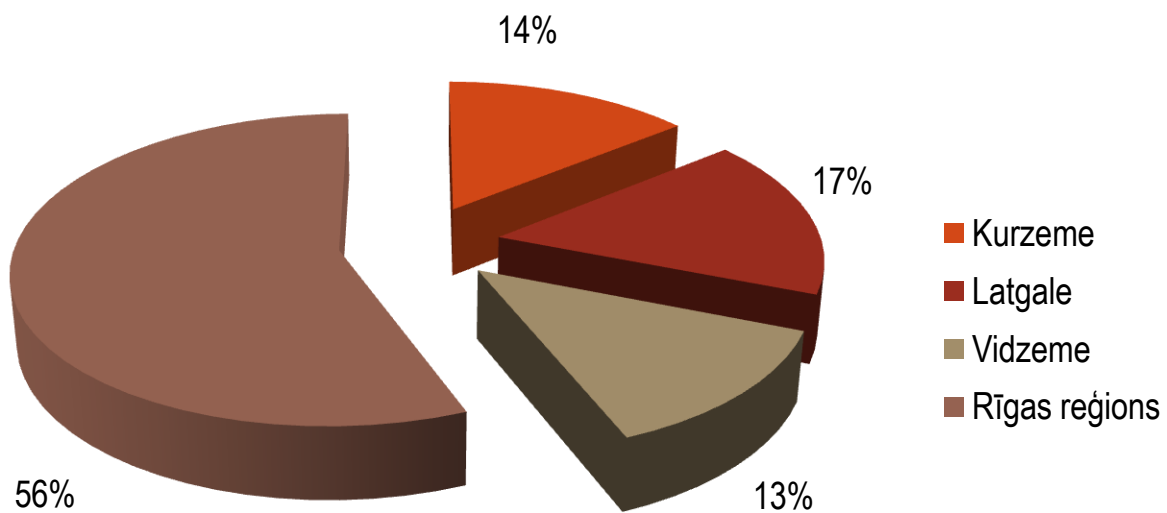

**Apmācīto personu sadalījums pēc ārstniecības atbalsta grupas (kopējais skaits – 25933) uz 01.09.2011.**

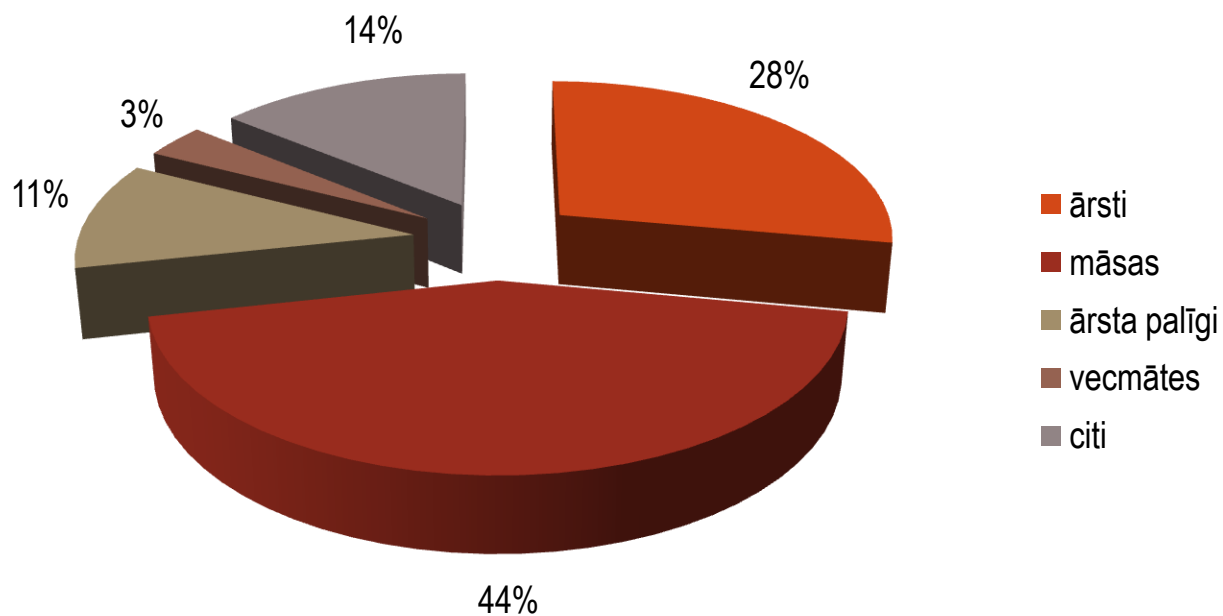

# Projekta mērķa grupas apmierinātība

- Apmācības pasākumu īstenotāji veic mērķa grupas anketēšanu, lai noteiktu apmierinātību ar apmācības pasākumu kvalitāti
- Anketās respondenti sniedz savu vērtējumu:
  - mācību procesam kopumā
  - mācību materiāla saturam
  - lektoru darbam
  - mācību procesa materiāli tehniskajam nodrošinājumam



# Mācību procesa vērtējums kopumā

Lielākā daļa apmācības pasākumu apmeklētāju mācību procesu novērtēja kā:

- interesantu un saistošu
- labi strukturētu
- noderīgu jaunas informācijas gūšanai




# Mācību materiāla saturs

Lielākoties novērtēts ar  
augstāko vērtējumu.


Ieteikumi:

- palielināt mācību ilgumu, lai būtu iespējams vairāk iedziļināties katras tēmas izklāstā



# Lektoru darbs

- Lielākoties novērtēts ar augstāko vērtējumu.
- Vislabākās atsauksmes par kursiem:
  - “Psihisko un uzvedības traucējumu agrīna diagnostika primārajā veselības aprūpē” (īstenotājs Latvijas Ārstu biedrība)
  - “Diagnostikas, ārstēšanas un aprūpes principi ambulatorā dienesta ārsta palīgu praksē” (īstenotājs Latvijas Ārstu biedrība)

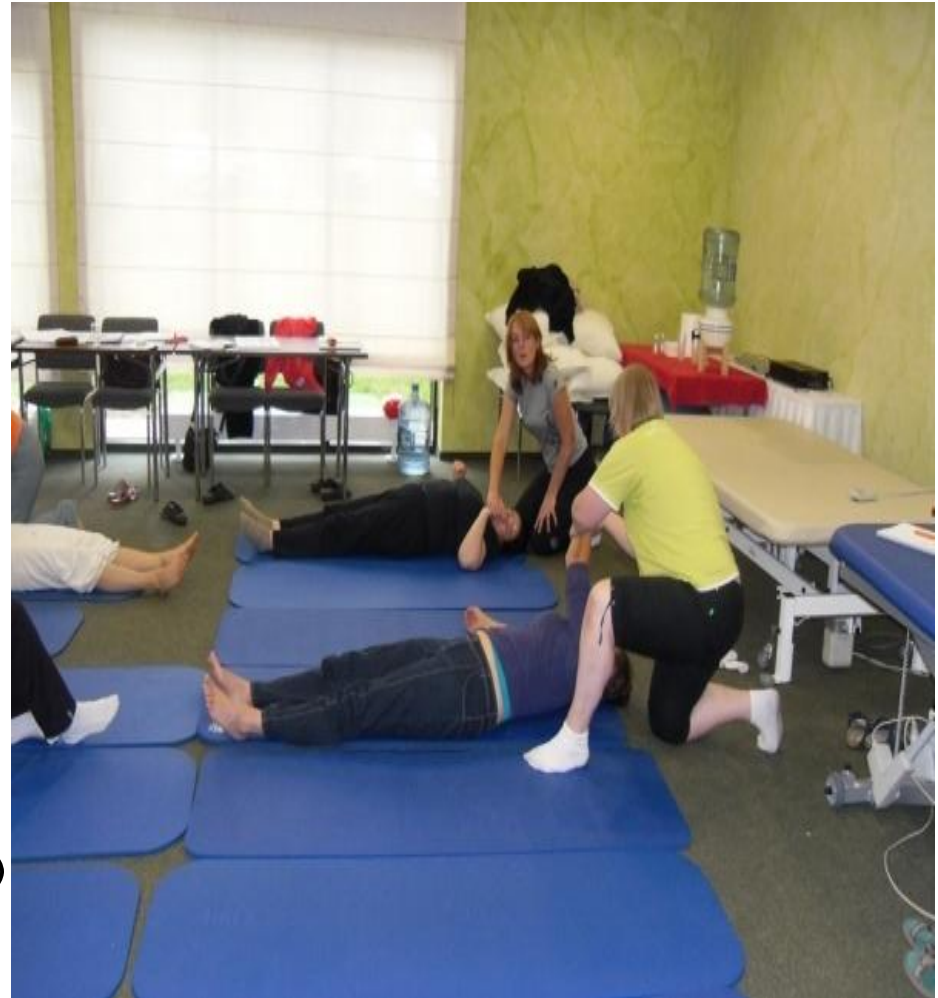



*Paldies par uzmanību!*

[www.talakizglitiba.lv](http://www.talakizglitiba.lv)

